


## Informe de inspección

|            |                     |          |                                  |                            |                    |
|------------|---------------------|----------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Fecha :    | Número de trabajo : | Tiempo : | Operador :<br><b>Poi Bardera</b> | Nº del tramo :<br><b>1</b> | Nombre del tramo : |
| Presente : | Vehículo :          | Camara : | Preestablecer :                  | Limpio :<br><b>si</b>      | Grado :            |

|                                 |           |  |
|---------------------------------|-----------|--|
| Calle : <b>Av. del Norte, 7</b> | Mapa 1 :  | Pozo inicio : <b>Arqueta en porteria</b> |
| Población : <b>Hospitalet</b>   | Mapa 2 :  | Pozo final : <b>Interior finca</b>       |
| Situación :                     | Cinta 1 : | Longitud tramo : <b>11,10 m</b>          |
|                                 | Media 1 : | Longitud tubería:                        |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Motivo de inspección : <b>Control general del estado</b> | Diametro : <b>200 mm</b> |
| Tipo :   | Material :               |
| Distrito :   | Revestimiento :          |
| Recambio :   | Recambio :               |

Comentarios :
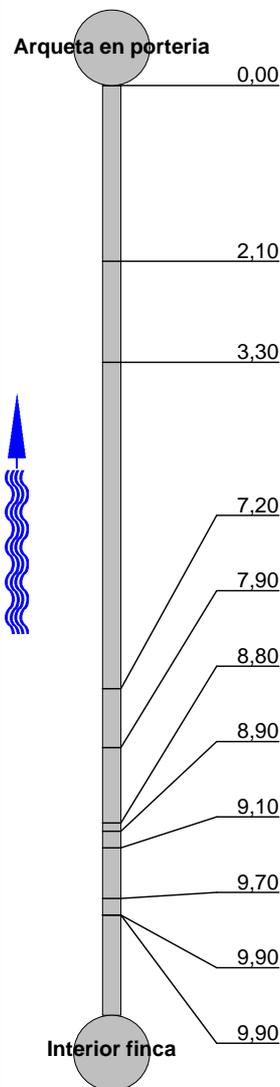
| 1:90   | Posición                   | Código | Incidencia, Observaciones                      | Grado  |
|--|----------------------------|--------|--|--|
|  | <b>Arqueta en porteria</b> |        |  |  |
|  | 0,00                       | ICNI   | Inicio de la inspección                        | <br>2,1 m // 00:03:07   |
|  | 2,10                       | AC     | Acometida desde 01 hasta 04 horas              | <br>2,1 m // 00:03:07  |
|  | 3,30                       | AC     | Acometida desde 08 hasta 11 horas              | <br>3,3 m // 00:03:43 |
|  | 7,20                       | AC     | Acometida desde 01 hasta 04 horas              | <br>3,3 m // 00:03:43 |
|  | 7,90                       | AC     | Acometida desde 01 hasta 03 horas              | <br>7,2 m // 00:04:43 |
|  | 8,80                       | AC     | Acometida desde 08 hasta 12 horas              |  |
|  | 8,90                       | R      | Roturas. Faltan trozos desde 09 hasta 11 horas |  |
|  | 9,10                       | R      | Roturas. Faltan trozos desde 10 hasta 02 horas |  |
|  | 9,70                       | R      | Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 06 horas |  |
|  | 9,90                       | AC     | Acometida desde 10 hasta 02 horas              |  |
|  | <b>Interior finca</b>      | IFIN   | Fin de la inspección                           |  |

## Fotografías de la inspección

|                                  |                                   |         |                            |                    |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------|----------------------------|--------------------|
| Población :<br><b>Hospitalet</b> | Calle :<br><b>Av. delNorte, 7</b> | Fecha : | Nº del tramo :<br><b>1</b> | Nombre del tramo : |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------|----------------------------|--------------------|

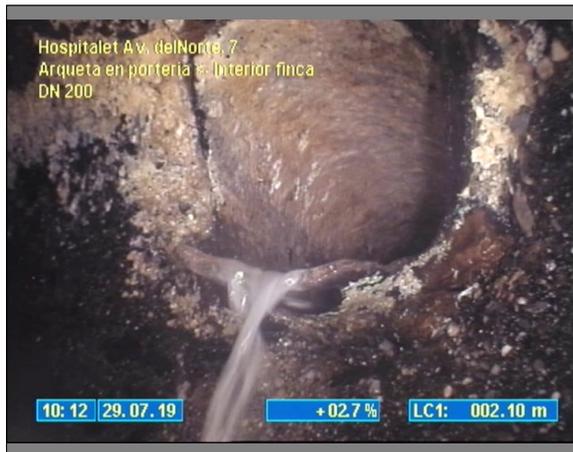


Foto: 1\_2A  
2,1m, Acometida desde 01 hasta 04 horas



Foto: 1\_2B  
2,1m, Acometida desde 01 hasta 04 horas



Foto: 1\_3A  
3,3m, Acometida desde 08 hasta 11 horas



Foto: 1\_3B  
3,3m, Acometida desde 08 hasta 11 horas
